




แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

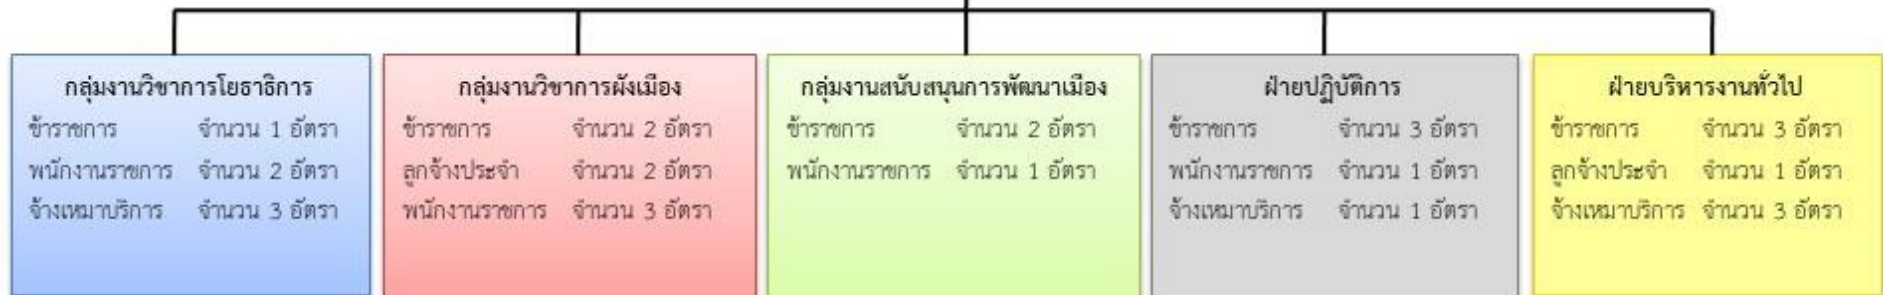

ข้าราชการ	จำนวน	12	คน
ลูกจ้างประจำ	จำนวน	3	คน
พนักงานราชการ	จำนวน	7	คน
พนักงานจ้างเหมาบริการ	จำนวน	7	คน
รวม	จำนวน	29	คน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๑. การแก้ไขปัญหาฝักตบขวา	รายงานผลการดำเนินการปัจจุบันที่จังหวัดรับผิดชอบ จำนวน/ตัน (โดยอ้างอิงข้อมูลในการรายงานครั้งก่อน ประกอบด้วย) ๑.๑ แหล่งน้ำปิดสาธารณะจำนวนทั้งหมด.....๕๐.....แห่ง - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....๑.....แห่ง / จำนวนทั้งหมด ...๒,๖๘๘.....ตัน - ปิดตบฝักตบขวา.....๔๙.....แห่ง - ดำเนินการแล้ว.....๑.....แห่ง จำนวน...๑,๓๔๔.....ตัน - คงเหลือยังไม่ดำเนินการ.....๑.....แห่ง ๑.๒ แหล่งน้ำเปิด / แหล่งน้ำเชื่อมโยงจำนวน.....๔๙.....แห่ง - มีฝักตบขวาและวัชพืช....๓๘.....แห่ง / จำนวนทั้งหมด.....๓,๒๔๑.....ตัน - ปิดตบฝักตบขวา....๑๑.....แห่ง - ดำเนินการแล้ว.....๓๗.....แห่ง จำนวน...๒,๘๗๘.....ตัน - คงเหลือยังไม่ดำเนินการ.....๑.....แห่ง	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักรในการกำจัด ฝักตบขวาและวัชพืช ที่มีประสิทธิภาพและขาด งบประมาณจัดหาอุปกรณ์ ดำเนินการกำจัดฝักตบขวา และวัชพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกำจัดฝักตบขวา และวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้ผลเป็นรูปธรรม เห็นควร จัดหางบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการกำจัด ฝักตบขวาและวัชพืชสิ่งกีด ขวางทางน้ำ เพื่อควบคุมการ แพร่ขยายพันธุ์ของฝักตบขวา และวัชพืช อย่างต่อเนื่อง ต่อไป	- ให้นำแบบเอกสารข้อมูลและ แผนในการดำเนินการของ แหล่งน้ำแต่ละแห่ง

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๒. งานตรวจสอบอาคารภาครัฐ	๒.๑ ฐานข้อมูลอาคารภาครัฐ.....๗๘๕.....หลัง ๒.๑.๑ อาคาร ๙ ประเภท.....๙๐.....หลัง - ตรวจสอบแล้วเสร็จเหลือรวบรวมข้อมูล - แจ้งกรมโยธาธิการและผังเมือง ๒.๑.๒ อาคารภาครัฐอื่นๆ..... ๗๘๕.....หลัง ๒.๑.๓ แผนการตรวจ.....๖๐.....หลัง ๒.๑.๔ ผลการดำเนินการ (๑) ในปีงบประมาณนี้.....๗๕.....หลัง (๒.) ยอดรวมสะสม..... ๗๘๕.....หลัง (ไม่นับอาคารที่ตรวจซ้ำ) ๒.๑.๕ อาคารที่สมควรได้รับการปรับปรุง จำนวนหลัง		รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ฐานข้อมูล หมายถึง จำนวนอาคารราชการทั้งหมดใน จังหวัด - อาคารที่สมควรที่ได้รับการปรับปรุง หมายถึง อาคารที่ มีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหรืออาจไม่ ปลอดภัยด้านโครงสร้างหรือ งานระบบ เป็นต้น ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารทุกปี / ปีละทุก ๓ ปี การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท จะต้องมีการตรวจสอบอาคาร ทุกปี/ปีละทุก ๓ ปี โดยต้องทราบข้อมูลอาคาร ๙ ประเภท ทั้งจังหวัด (จำนวน/ที่ตั้ง) มีเท่าไร และให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งอำเภอแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แจ้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และส่งผล การตรวจสอบอาคารทุกๆ ปี แจ้งกลับให้จังหวัดทราบ และทำบัญชีข้อมูลการ ตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทไว้ด้วย

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)			
๑. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งบประมาณกรม ที่โอนให้จังหวัดดำเนินการ)			
๑.๑ งบดำเนินงาน	๑.๑.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๔๕๐ บาท ๑.๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๔๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)		
๑.๒ งบลงทุน	๑.๒.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๘๒๖,๐๐๐ บาท ๑.๒.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๒๖,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)		
๑.๓ งบรายจ่ายอื่น	๑.๓.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๑๒๓,๒๕๐ บาท ๑.๓.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๓,๒๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)		
๑.๔ งบภาพรวม	๑.๔.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๔,๑๘๕,๕๐๐ บาท ๑.๔.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๑๘๕,๕๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๒. โครงการงบลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน - โครงการศึกษาออกแบบ - โครงการพัฒนาเมือง - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการพิเศษอื่นๆ	๒.๑ โครงการงบลงทุนที่กรมฯ ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน.....๑๐.....โครงการ ๒.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกตัดในปีนี้....โครงการ ๑.๒.๑ โครงการ.....-..... ๑.๒.๒ โครงการ.....-..... ๒.๓ โครงการงบผูกพันที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง ๒.๓.๑ ชื่อโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหนุนใต้ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ความยาว ๑,๐๙๖ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๔๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๔ ผูกพันปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๒๔ วัน จากเดิม ๖๕๐ วัน ขยายระยะเวลา เพิ่มอีก ๓๗๔ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดาพร จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ผลงานร้อยละ ๙๓.๙๔ ซ้ำกว่าแผนงาน ร้อยละ ๖.๐๖ - เบิกจ่ายร้อยละ ๗๒.๗๒ เป็นเงิน ๓๕,๙๖๑,๕๐๐ บาท	อธิบายรายละเอียดในเอกสาร แนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)	รายละเอียดแต่ละโครงการ ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๒ ชื่อโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ความยาว ๗๗๐ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - วงเงินตามสัญญา ๔๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๔ ผูกพันปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ - สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ - รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๒๙ วัน จากระยะเวลาเดิม ๖๕๐ วัน - ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก ๓๗๙ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่สถาพร (๑๙๘๑) จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ผลงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นเงิน ๔๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท - ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗	อธิบายรายละเอียดในเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)	รายละเอียดแต่ละโครงการให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๓ ชื่อโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม แม่หล่าย หมู่ที่ ๒ ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ความยาว ๗๕๒ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๗๙,๕๖๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๕ ผูกพันปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๒๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก ๓๒๓ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๗๓ วัน จากระยะเวลาเดิม ๖๕๐ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดาพร จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๕.๐๐ - ผลงานร้อยละ ๐.๕๐ ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๗๔.๕๐ - เบิกจ่ายร้อยละ - เป็นเงิน - บาท	อธิบายรายละเอียดในเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)	รายละเอียดแต่ละโครงการให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๔ ชื่อโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ แม่พวกเขตเทศบาล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ความยาว ๒,๐๗๑ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๗๙,๑๗๕,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๕ ผูกพันปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐๐ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่สถาพร (๑๙๘๑) จำกัด - แผนงานร้อยละ ๘๙.๔๒ - ผลงานร้อยละ ๔๖.๒๑ ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๔๓.๒๑ - เบิกจ่ายร้อยละ ๓๖.๕๔ เป็นเงิน ๒๘,๙๓๒,๒๕๐ บาท - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๕ ชื่อโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านสองแคว หมู่ที่ ๗ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ความยาว ๕๗๕ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - วงเงินตามสัญญา ๓๙,๕๖๕,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๕ ผูกพันปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๕๕๓,๖๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑,๐๑๑,๔๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕๐ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่สถาพร (๑๙๘๑) จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ผลงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นเงิน ๓๙,๕๖๕,๐๐๐ บาท - ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๖ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ ริมแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๗๘๖.๕๐ เมตร - ขั้นตอนการการดำเนินงาน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - วงเงินตามสัญญา ๑๐๕,๖๗๓,๒๐๔ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๓ ผูกพันปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๒,๘๗๕,๘๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๙,๔๘๔,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖,๘๑๓,๒๐๔ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๖๙ วัน จากระยะเวลาเดิม ๗๐๐ วัน ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก ๕๖๙ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท ดี แอนด์ มายด์ จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๐๐ - ผลงานร้อยละ ๑๐๐ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๑๐๕,๖๗๓,๒๐๔ บาท - ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๗ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ ริมแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะที่ ๒ ความยาว ๑,๒๔๓ เมตร - ขั้นตอนการการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๑๗๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ ผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๐,๑๔๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๘๐ วัน - ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า แอลเอสซีวีลคอนสตรัคชั่น - แผนงานร้อยละ ๐.๐๐ - ผลงานร้อยละ ๐.๐๐ - เบิกจ่ายร้อยละ - เป็นเงิน - บาท		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๘ ชื่อโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่พวก ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ความยาว ๙๘๒ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๔๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ ผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕๐ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดาพร จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๗.๙๕ - ผลงานร้อยละ ๑.๗๔ ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๑๖.๒๑ - เบิกจ่ายร้อยละ - เป็นเงิน - บาท		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๙ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหัวเมือง หมู่ที่ ๑ และบ้านวังพ่อน หมู่ที่ ๗ ,หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ความยาว ๑,๒๙๐ เมตร - ขั้นตอนการการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๔๙,๔๖๙,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ ผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙,๔๖๙,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕๐ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่สถาพร (๑๙๘๑) จำกัด - แผนงานร้อยละ ๐.๔๙ - ผลงานร้อยละ ๐.๒๐ ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๐.๒๙ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๐๐ เป็นเงิน ๗,๔๒๐,๓๕๐บาท		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	๒.๓.๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เมืองเก่าแพร่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๕๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ ผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙,๘๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐๐ วัน - ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง - แผนงานร้อยละ ๖.๘๐ - ผลงานร้อยละ ๐.๓๘ ช้ากว่าแผน ร้อยละ ๖.๔๒ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๐๐ เป็นเงิน ๗,๘๔๕,๐๐๐ บาท		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
๓. โครงการงบลงทุนที่กรมโยธาให้จังหวัดดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมหาด และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สำนักงาน อาคารทดสอบ บ้านพักข้าราชการและอื่นๆ - จัดซื้อจัดหาวัสดุ - โครงการก่อสร้างถนนตามโครงการจัดรูป ที่ดินฯ - โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง	๓.๑ โครงการงบลงทุนที่กรมฯ ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ ๓.๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ - ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ - งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๗ - ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง นายแดง คูหา - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน - แผนงานร้อยละ ๑๐๐ - ผลงานร้อยละ ๑๐๐ - เบิกจ่ายร้อยละ - เป็นเงิน - บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย) ๓.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกตัดกักในปี.....โครงการ ๓.๓.๑ โครงการ.....-..... ๓.๒.๑ โครงการ.....-..... ๓.๓ โครงการงบผูกพันที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง ๓.๓.๑ โครงการ.....-..... ๓.๒.๑ โครงการ.....-.....		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง	๑. ผังเมืองในจังหวัด จำนวน๑๑..... ผัง ๑.๑ ผังนโยบายระดับจังหวัด จำนวน-..... ผัง ๑.๒ ผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน๑..... ผัง ๑.๓ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน๑๐..... ผัง ๑.๔ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด-..... ผัง ๑.๕ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งอำเภอ.....-..... ผัง ๒. ผังเมืองที่ยังประกาศบังคับใช้ จำนวน๖..... ผัง ๒.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๒ ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒.๓ ผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๔ ผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๕ ผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๖ ผังเมืองรวมชุมชนแม่หลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. การดำเนินการจัดทำผัง ๓.๑ ผังเปิดใหม่ จำนวน๕..... ผัง (๑) กรมฯ ดำเนินการเอง จำนวน-..... ผัง (๒) กรมฯ ว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน-..... ผัง (๓) สยผจ. ดำเนินการ จำนวน๕..... ผัง ๓.๒ ผังถ่ายโอนให้ อปท. ดำเนินการ จำนวน-..... ผัง ๔. ผังที่มีการขอแก้ไข ตามมาตรา ๓๕ จำนวน๑.....ผัง ๔.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินการโดย สยผจ.แพร่ (๓ เรื่อง ๕ ประเด็น) อยู่ในขั้นตอนที่ ๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ มติให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมือง อีกครั้ง		สามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง (ต่อ)	๕. ผังเมืองที่หมดอายุ อยู่ระหว่างปรับปรุง จำนวน-..... ผัง ๖. ผังเมืองที่เปิดใหม่ จำนวน๕..... ผัง ๖.๑ ผังเมืองรวมชุมชนข้อแอส (เปิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ อยู่ขั้นตอนที่ ๕ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน..... ๖.๒ ผังเมืองรวมชุมชนวังชิ้น (เปิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ อยู่ขั้นตอนที่ ๔ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน..... ๖.๓ ผังเมืองรวมชุมชนลอง (เปิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ (ขยายเขตผังเดิมอำเภอ) อยู่ขั้นตอนที่ ๒ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน... (เตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม) ๖.๔ ผังเมืองรวมชุมชนหนองม่วงไข่ (เปิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ (ขยายเขตผังเดิมอำเภอ) อยู่ขั้นตอนที่ ๒ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน... (เตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม) ๖.๕ ชื่อผังเมืองรวมชุมชนสอง (เปิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ (ขยายเขตผังเดิมอำเภอ) อยู่ขั้นตอนที่ ๒ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน... (เตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม)		รอกรมกำหนดแผนงาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ รอกรมกำหนดแผนงาน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๔. การดำเนินการด้านผังเมือง (ต่อ)	๗. ผังเมืองที่อยู่ระหว่างปรับปรุง จำนวน.....๓.....ผัง ๗.๑ ผังเมืองรวมเมืองแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงผังครั้งที่ ๓) ผู้ดำเนินการ กรมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา อยู่ขั้นตอนที่ ๓ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน... (เตรียม ๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประสานแผนฯ) ๗.๒ ผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จัน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ดำเนินการ กรมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา อยู่ขั้นตอนที่ ๓ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน... (๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประสานแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ๗.๓ ผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ อยู่ขั้นตอนที่ ๒ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....ช้ากว่าแผน... (เตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม) ๘. ผังเมืองที่ดำเนินการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปี จำนวน-.....ผัง ๙. ผังเมืองที่ดำเนินการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และ สิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน๑..... ผัง ๗.๑ ผังเมืองรวมชุมชนร้องวาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ อยู่ขั้นตอนที่ ๑ สรรวจข้อมูล เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....เป็นไปตามแผน...		ขึ้นอยู่กับแผนงานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขึ้นอยู่กับแผนงานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)(ต่อ)			
	๑๐. ผังเมืองที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัด จำนวน๑...ผัง - ชื่อผังเมืองรวมชุมชนสอง (เปิดตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๖๕) ผู้ดำเนินการ สยผจ.แพร่ (ขยายเขตผังเดิมอำเภอ) อยู่ขั้นตอนที่ ๒ (พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร....ช้ากว่าแผน... (เตรียมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม)		
๕. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขั้นเตรียมโครงการ (ระยะเวลา ๑ปี) ☐ ๑. ขั้นเตรียมโครงการ ☐ ๒. วางผังแม่บทโครงการออกแบบผังทางเลือก ☐ ๓. วางแผนการดำเนินและร่างผังที่ดินแปลงใหม่เบื้องต้น ☐ ๔.รวบรวมความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) และจัดทำคำขอเสนอโครงการ (จร.๒) ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน) ☐ ๔.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัดและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑,๔๓) ☐ ๔.๒ ประกาศเขตสำรวจโครงการ (มาตรา ๔๒) ☐ ๔.๓ สำรวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ ☐ ๔.๔ ประกาศโครงการพร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓) ☐ ๕. คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการและประกาศโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗)	๕.๑ โครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จสมบูรณ์๑..... แห่ง - พื้นที่เป้าหมายโครงการที่มีแผนดำเนินการ๒..... แห่ง ๕.๒ พื้นที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ-..... แห่ง ๕.๓ พื้นที่โครงการสำรองเพิ่มเติม๓..... แห่ง ๕.๓.๑ บริเวณ ตำบลร่องฟอง /ขั้นตอนดำเนินการ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นแล้ว มีอาคารบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ในแนวถนนโครงการ ๕.๓.๒ บริเวณตำบลนาจักร /ขั้นตอนดำเนินการ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นแล้ว มีอาคารบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ในแนวถนนโครงการ ๕.๓.๓ บริเวณตำบลแม่หล่าย /ขั้นตอนดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นแล้ว มีอาคารบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ในแนวถนนโครงการ	จัดหาพื้นที่อื่นโดยได้มีหนังสือแจ้งอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งศึกษากฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งเมืองครปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่หล่าย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ทั้ง ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล แปลงที่ดิน และหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการ	

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)			
๖. การให้บริการด้านช่าง และด้านผังเมือง ๖.๑ งานบริการด้านผังเมือง	งานให้บริการด้านช่างและด้านผังเมือง ดังต่อไปนี้ มีจำนวนกึ่งงาน ๖.๑.๑ งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผน.....-.....เรื่อง ผลการดำเนินการ.....๓๒.....เรื่อง ๖.๑.๒ งานบริการข้อมูลและแผนที่ แผน.....-.....ครั้ง ผลการดำเนินการ.....-.....ครั้ง ๖.๑.๓ งานตรวจสอบระดับที่ตั้งอาคาร โดยใช้เครื่องมือ GPNPS-.....ครั้ง ๖.๑.๔ งานอื่น ๆ		(โปรดแสดงรายละเอียดแนบ ท้าย) หากมีข้อมูลโครงการ จำนวนมากให้จัดทำ เป็นเอกสารแนบ
๖.๒ งานด้านช่างที่ให้บริการ	๖.๒.๑ งานให้คำปรึกษาด้านช่าง จำนวน.....๑๗๐.....งาน ๖.๒.๒ งานสำรวจ จำนวน.....๒๐.....งาน ๖.๒.๓ งานออกแบบ จำนวน.....๒๐.....งาน ๖.๒.๔ งานเขียนแบบ จำนวน.....๒๐.....งาน ๖.๒.๕ งานประมาณราคา จำนวน.....๒๕.....งาน งบประมาณ.....-.....บาท ๖.๒.๖ งานแบ่งงวดงาน จำนวน.....๒.....งาน ๖.๒.๗ งานตรวจรับรองแบบ จำนวน.....๓.....งาน งบประมาณ.....-.....บาท		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)			
๖.๒ งานด้านช่างที่ให้บริการ (ต่อ)	๖.๒.๘ งานที่ให้บริการครบทั้งกระบวนการ (สำรวจ,ออกแบบ,เขียนแบบ,ประมาณราคา,แบ่งงวดงาน จำนวน.....๒๐.....โครงการ ๖.๒.๙ งานทดสอบวัสดุ แบ่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๔,๑๙๔ ตัวอย่าง จำนวนโครงการ ☒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๖๑๔ ตัวอย่าง/ จำนวน.....โครงการ ☒ หน่วยงานราชการอื่น ๑๒๐ ตัวอย่าง / จำนวน.....โครงการ ☒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒,๒๓๓ ตัวอย่าง / จำนวน.....โครงการ ☒ เอกชน ๑๒๒๗ ตัวอย่าง / จำนวน.....โครงการ		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
๖.๒ งานด้านช่างที่ให้บริการ (ต่อ)	๖.๒.๙ งานคณะกรรมการ/คณะทำงาน (งานประชุม) จำนวน.....๑๙๐.....งาน ๖.๒.๑๐ งานควบคุมงาน จำนวน.....๑๗.....งาน งบประมาณ.....-.....บาท ๖.๒.๑๑ งานตรวจการจ้าง จำนวน.....๒๑.....งาน งบประมาณ.....-.....บาท ๖.๒.๑๒ งานคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ - คณะกรรมการ TOR จำนวน.....๓.....งาน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน.....๕.....งาน - คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน.....๓.....งาน - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน.....๒.....งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการอื่นๆ จำนวน.....-.....งาน ๖.๒.๑๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่าง ให้แก่ อปท. จำนวน.....๑.....งาน		

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)			
๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่ม จังหวัดพัฒนาภาค ที่ สยผจ.เป็นหน่วย ดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปีนี้)	๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๓ บ้านวังวน ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ความยาว ๑๖๕ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๑๓,๙๒๒,๑๘๕ บาท - ปังงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ - สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖, สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน - ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดาพร จำกัด - แผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - ผลงานร้อยละ ๘๕.๐๘ เร็วกว่าแผน ร้อยละ ๑๔.๙๒ - เบิกจ่ายร้อยละ ๖๓.๑๐ เป็นเงิน ๘,๗๘๔,๙๖๕ บาท		หากมีข้อมูลโครงการจำนวน มากให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)			
๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่ม จังหวัดพัฒนาภาค ที่ สยผจ.เป็นหน่วย ดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปี)	๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๓ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ความยาว ๓๐๐ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๑๙,๙๖๕,๐๐๐ บาท - ปังงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ - สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๘๑ วัน (เดิม ๓๕๐ วัน) ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๑ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ผู้รับจ้าง บริษัท ศักดาพร จำกัด - แผนงานร้อยละ ๘๙.๗๘ - ผลงานร้อยละ ๒๓.๔๕ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๖.๓๓ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕.๐๐ เป็นเงิน ๒,๙๙๔,๗๕๐ บาท		หากมีข้อมูลโครงการจำนวน มากให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)			
๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่ม จังหวัดพัฒนาภาค ที่ สยผจ.เป็นหน่วย ดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปี)	๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว ๘๐๐ เมตร - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - วงเงินตามสัญญา ๔๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท - ปังงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี ๒๕๖๖ - สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ - สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ - เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๘ วัน - ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๒๘ วัน (เดิม ๕๐๐ วัน) เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ - ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่สถาพร ๑๙๘๑ จำกัด - แผนงานร้อยละ ๘๘.๐๔ - ผลงานร้อยละ ๒๕.๑๕ ซ้ำกว่าแผนงาน ร้อยละ ๖๒.๘๙ - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๕ เป็นเงิน ๖,๑๑๕,๕๐๐ บาท		หากมีข้อมูลโครงการจำนวน มากให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ง. งานพิเศษ ๑. โครงการพิเศษที่ สยผจ. ได้รับมอบหมาย	๑.๑ ข้อมูลโครงการ (ให้แจงแต่ละโครงการ) - โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ ๖๕๗,๑๑๕,๔๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ - สัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - วงเงินจ้าง ๕๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) - ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า AKC ๑.๒ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย - แผนงานก่อสร้าง ร้อยละ ๒๖.๐๐ (อยู่ระหว่างปรับแผน) - ผลงานร้อยละ ๑๕.๖๔ - ชำกว่าแผนงาน ๑๐.๓๖ (ระยะเวลาพบปัญหาเดิม) - เบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๐๐ เป็นเงิน ๙๗,๒๓๙,๒๐๐ บาท - ขั้นตอน ก่อสร้างเสาชั้นที่ ๑ - เริ่ม ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับการ ช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ได้ ๔๗๕ วัน สิ้นสุดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ระยะเวลาใช้ไป ๑๑๖๗ วัน คงเหลือ ๓๖๙ วัน รวม ๑,๕๓๖ วัน	๑. ผังบริเวณแบบรูปรายการ ขัดแย้งกับผังการขออนุญาตใช้ ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ๒. ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน	หากมีข้อมูลโครงการจำนวน มากให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ
